




Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba

AUDITORIA TEMÁTICA 03/2025 PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA



Diretoria de Auditoria e
Fiscalização - DIAFI



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Auditoria Temática nº 03/2025

Programa Paraíba Primeira Infância

Período de 2022 a 2025.

Junho de 2025

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira

Presidente do TCE-PB

ACE Eduardo Ferreira Albuquerque

Diretor da DIAFI

Elaboração

Grupo de Planejamento e Controle - GPC

Sumário

1	Introdução	6
2	Dos convênios visando a construção de creches	6
2.1	Tipos de creches previstas	6
2.2	Repasses financeiros dos convênios	7
3	Ações do TCE-PB na Fiscalização dos Convênios para a Construção de Creches	7
3.1	Acompanhamento da contabilização dos recursos e da realização de procedimentos licitatórios	8
3.2	Auditoria Coordenada - 2023	8
3.3	Inspeção Especial de Contas - Secretaria do Estado da Educação	9
3.4	Auditoria Coordenada - 2024	9
3.5	Representações do Ministério Público de Contas	10
4	Situação em junho de 2025	11
4.1	Disponibilidades dos recursos nas contas municipais	11
4.2	Situação das obras	11
4.3	Municípios com indícios de inexecução dos recursos recebidos	15
4.4	Prejuízo ao atendimento de crianças	15
4.5	Comparativo entre as obras visitadas e não visitadas em Auditorias Coordenadas do TCE-PB .	16
4.6	Vigências dos convênios - situação em junho de 2025	17
5	Considerações Finais	18
6	Anexos	20

Lista de Tabelas

1	Situação das obras.	12
2	Obras não iniciadas.	15
3	Crianças não atendidas.	15
4	Comparação entre os municípios visitados e não-visitados.	16
5	Vigência dos convênios - creches.	17
6	Situação das obras em junho de 2025.	20

7	Representações - MPC.	25
8	Disponibilidades nas contas vinculadas - maio/2025	26

Lista de Figuras

1	Transferências de recursos dos convênios.	7
2	Classificação de riscos.	10
3	Transferências de recursos dos convênios.	12
4	Imagens enviadas ao sistema Geo-PB.	13
5	Juarez Távara - dados do Geo-PB.	14
6	Creche concluída em Mogeiro-PB.	14

1 Introdução

Em novembro de 2021 o Governo do Estado da Paraíba sancionou a Lei Estadual nº 12.141/2021, dispondo sobre o programa “Paraíba Primeira Infância”. No bojo do plano de trabalho do referido programa, a Secretaria do Estado da Educação apresentou as seguintes ações:

- Apoiar os municípios paraibanos com recursos orçamentários para construção de unidades de creches/pré-escolas;
- A construção das creches atenderá critérios de: municípios com menos de 50% das crianças com faixa etária de 0 a 5 anos matriculadas em creches/pré-escola e em municípios que tenham no máximo uma unidade com oferta exclusiva para creche.;
- Ampliar a oferta de educação infantil em creches para elevar a porcentagem de crianças atendidas;
- Realizar formações continuadas visando a capacitação dos(as) profissionais que atuam nas redes de educação dos municípios;
- Monitorar junto aos municípios, a ausência e/ou a ampliação de vagas em creches;
- Disseminar experiências exitosas relativas a boas práticas no desenvolvimento da educação infantil nos municípios;
- Fomentar ações interligadas entre saúde, educação, assistência social e políticas de esportes, juventude e lazer para proporcionar bem estar social da comunidade.

No período de dezembro de 2021 a julho de 2022, a Secretaria de Educação do Estado celebrou convênios com 212 municípios paraibanos para a construção de creches do tipo padrão, para 100 e 50 crianças. O presente relatório abordará a execução específica dessa ação, ao longo dos últimos anos.

2 Dos convênios visando a construção de creches

2.1 Tipos de creches previstas

Foram previstos dois tipos de creches como objetos dos convênios celebrados com os municípios. As creches de tipo A, projetada para atender até 100 crianças em período integral, e as de tipo B, visando atender até 50 crianças. Os respectivos cronogramas de execução previstos são os seguintes:


- Creche do tipo A - 10 meses¹;
- Creche do tipo B - 7 meses.

Em ambos os casos, o Governo do Estado foi o responsável pela elaboração de todas as especificações técnicas das creches objetos dos convênios, cabendo aos municípios os ajustes necessários e a execução da obra. As creches do Tipo A possuíam valor estimado de R\$ 1.116.745,22, enquanto as do Tipo B possuíam valor estimado de R\$ 869.005,97.

¹<https://drive.google.com/file/d/1CrZdcUGIGJNzOBNoJrvi3aYualwmgMdm/view?usp=drive_link>

2.2 Repasses financeiros dos convênios

Os repasses financeiros, conforme dados do SIAF Estadual ocorreram entre janeiro de 2022 a julho de 2022, conforme apresentado no gráfico que segue.

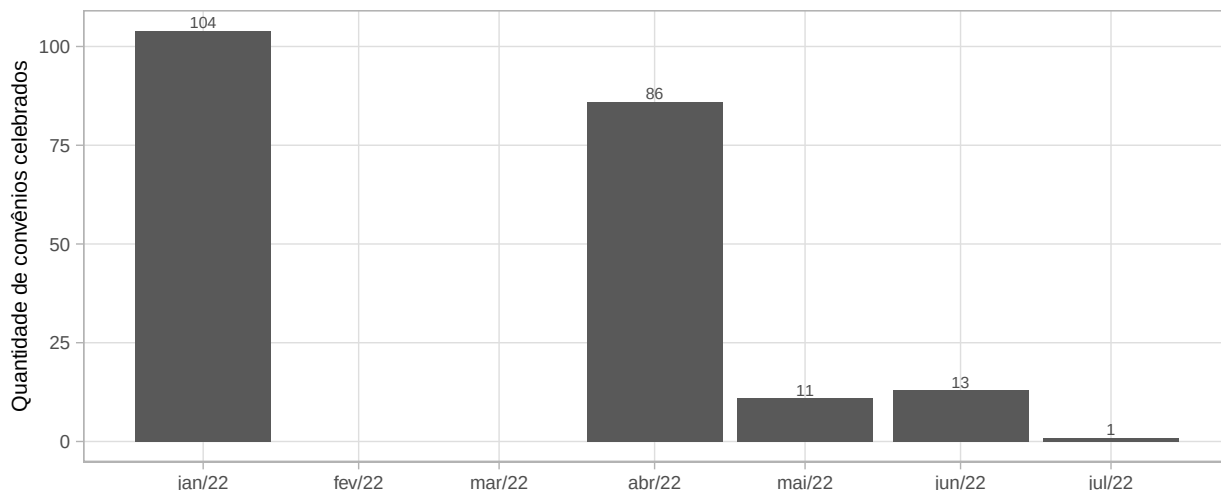

*Dados do Portal da Transparência do Governo da Paraíba

Figura 1: Transferências de recursos dos convênios.

Até abril de 2022, 190 municípios receberam os recursos para execução dos objetos conveniados em contas bancárias específicas e o restante até julho do mesmo ano. Ao todo, foram 109 creches do Tipo B e 106 creches do Tipo A, totalizando 215, em 212 municípios. Apenas 3 municípios foram contemplados com duas creches: Patos, Camalaú e Cabaceiras.

Os municípios de Nova Floresta² e Belém do Brejo do Cruz³ devolveram os recursos tempos após o recebimento, portanto, restaram 213 creches.

3 Ações do TCE-PB na Fiscalização dos Convênios para a Construção de Creches

Desde o ano de 2022, o Tribunal de Contas da Paraíba acompanha a execução dos convênios celebrados entre a Secretaria do Estado da Educação e os 212 municípios paraibanos. Um detalhamento histórico dessas ações será apresentado nos itens seguintes.

²O Município de Nova Floresta devolveu os recursos através do empenho nº 7544, de 28/12/2023.

³O Município de Belém do Brejo do Cruz devolveu os recursos através do empenho nº 538, de 31/01/2023.

3.1 Acompanhamento da contabilização dos recursos e da realização de procedimentos licitatórios

Uma vez que os recursos foram devidamente creditados em contas específicas dos municípios, cabem aos mesmos a devida contabilização e a consequente realização de licitação para execução dos objetos conveniados, uma vez que o prazo de vigência da maioria dos termos era de 12 meses a contar da assinatura.

Em agosto de 2022, foram produzidos 198 relatórios de auditoria pela Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI com a emissão de alertas aos respectivos gestores municipais. Os relatórios mencionados tinham por objetivo alertar os gestores sobre os seguintes pontos:

- ausência de informação da receita e respectiva disponibilidade dos recursos recebidos através do convênio firmado com o Governo do Estado da Paraíba;
- a não realização do procedimento licitatório objetivando a consecução do objeto do convênio;
- descumprimento da RN-TC nº 04/2017 no tocante ao envio das medições da obra conveniada ao sistema Geo-PB/TCE-PB;
- pagamento de despesas referentes ao objeto convênio por conta bancária diversa da específica;
- dados incorretos enviados ao SAGRES no tocante às contas bancárias específicas dos recursos recebidos através do convênio firmado com o Governo do Estado da Paraíba.

Dentre esses relatórios emitidos, ficou constatado que 93 municípios sequer tinham contabilizado os recursos recebidos. Após a emissão dos alertas, a situação no tocante à contabilização dos recursos foi sendo normalizada, permanecendo os problemas na execução das obras, como veremos a seguir.

3.2 Auditoria Coordenada - 2023

Diante da relevância do tema, em agosto de 2023 foi realizada a primeira Auditoria Coordenada com foco na fiscalização das obras relacionadas ao Programa Paraíba Primeira Infância. Naquela oportunidade a Auditoria registrou em relatório sobre a ação os critérios de seleção das 110 obras fiscalizadas *in loco*:

A seleção das obras, de forma resumida, foi baseada em dois critérios: montante e evolução dos pagamentos realizados ao longo do tempo e viabilidade logística.

Foram selecionadas 110 obras para a inspeção no âmbito da Auditoria Coordenada, o que representa 78,6% dos municípios que realizaram pagamentos, até 31/07/2023, com os recursos específicos. O valor total contratado dessa amostra é de aproximadamente R\$ 106 milhões, dos quais cerca de R\$ 51 milhões já foram pagos.

Como resultado dessa primeira ação, passados mais de doze meses desde o último recebimento de recursos por parte dos municípios, foram detectadas 83 obras em andamento, 24 obras paralisadas e apenas 3 concluídas. Das três consideradas concluídas, nenhuma estava em funcionamento.

Diversas falhas foram constatadas após a referida fiscalização, desde o local escolhido para a cons-

trução da creche até graves problemas estruturais. Todos os achados, incluindo as 915 imagens realizadas pelas equipes de Auditoria foram devidamente registrados em processo específico, o que será detalhado no item seguinte.

3.3 Inspeção Especial de Contas - Secretaria do Estado da Educação

Em decorrência dos achados de auditoria da Auditoria Coordenada nº 02/2023, foi instaurado no âmbito do TCE-PB o Processo TC nº 07333/23⁴, em setembro de 2023. O citado relatório apontou diversas falhas, tanto no tocante à execução dos objetos pelos municípios como no controle realizado pela Secretaria do Estado da Educação.

Sobre a administração financeira dos recursos pelos municípios, a Auditoria anotou em seu relatório inaugural o que segue:

Ao confrontar as situações detectadas na Auditoria Coordenada com os dados obtidos junto à SEE-PB, foram detectadas algumas situações que carecem de esclarecimentos. A primeira delas foi em relação a pagamentos significativamente superiores aos valores liberados. Em alguns casos, sequer havia, conforme dados da Secretaria de Estado, recursos liberados para a execução do objeto. No entanto, houve pagamentos informados ao Sistema SAGRES/TCE-PB através das contas específicas. A situação é demonstrada na Tabela 7, na qual apresentamos os casos de municípios com mais de R\$ 100 mil entre o valor pago e o liberado pela SEE-PB.

A lentidão na execução das obras foi um dos pontos abordados no relatório citado. Das 109 obras inspecionadas, a média estimada de evolução era de apenas 53,99%. Sobre esse ponto, a Auditoria registrou:

A situação é preocupante, uma vez que há bastante lentidão na execução dos objetos conveniados, mesmo naqueles casos em que a obra não se encontra paralisada. Em ambos os tipos de creche, o cronograma de execução estimado é inferior a um ano. Após mais de um ano do efetivo repasse de todos os recursos às entidades municipais, apenas três creches se encontram concluídas, no entanto, duas dessas não possuem eletricidade por ausência de ligação da rede elétrica. Na data da realização da Auditoria Coordenada, não houve registros de crianças sendo atendidas.

Atualmente o processo mencionado continua em tramitação, incluindo os novos resultados da Auditoria Coordenada realizada em 2024, que objetivou retornar às mesmas obras para fins de verificação dos respectivos andamentos, fato que será abordado no item seguinte.

3.4 Auditoria Coordenada - 2024

Em maio de 2024, foi realizada uma nova Auditoria Coordenada, com o objetivo de retornar às mesmas obras inspecionadas em agosto de 2023 e verificar a situação. Passados cerca de nove meses, a situação

⁴O processo pode ser acessado através do Sistema Tramita do TCE-PB.

geral de evolução ainda era baixa. O número de obras paralisadas tinha aumentado para 28, enquanto as em estado de “semi-paralisia”⁵ chegava a 26.

Foi elaborada uma classificação de risco conforme a evolução de cada uma das obras, conforme os seguintes critérios:

- Risco altíssimo – Obras reportadas como paralisadas (ou com evolução no período abaixo de 25%) e com execução total estimada abaixo ou igual de 75%;
- Risco alto – Obras reportadas como paralisadas e com execução total estimada acima de 75%;
- Risco moderado – Obras reportadas como em andamento e com execução total estimada entre 50 e 75%;
- Risco baixo – Obras não classificadas como risco altíssimo, alto ou moderado;
- Risco baixíssimo – Obras reportadas como concluídas.

O resultado obtido é apresentado na figura seguinte.

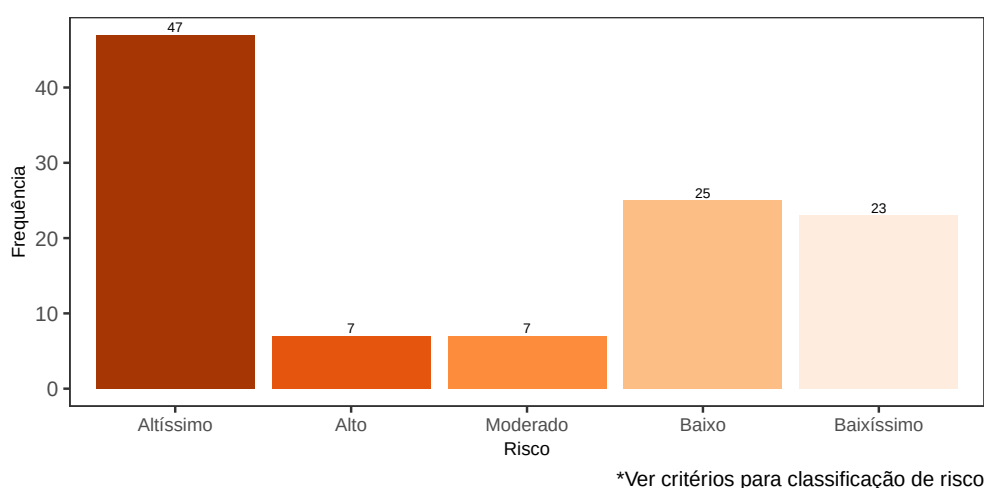


Figura 2: Classificação de riscos.

3.5 Representações do Ministério Público de Contas

Tendo em vista as situações detectadas na Auditoria Coordenada de 2023, mencionadas neste relatório, o Ministério Público de Contas representou 26 gestores municipais em virtude das situações no andamento das obras. Segue, como exemplo, os pedidos no âmbito do processo TC nº 770/24.

À vista da situação exposta, este Parquet de Contas requer: 1. O recebimento da presente Representação, com seu regular processamento nesta Corte de Contas; 2. A citação do Sr. Joao Marcos de Freitas, Prefeito Municipal de Boqueirão, para demonstrar, de forma clara e objetiva, o andamento atualizado da obra, inclusive com detalhes das medições

⁵Foram classificadas nessa categoria aquelas obras em andamento que apresentaram evolução estimada abaixo de 25%, entre a primeira verificação (15/08/2023) e da presente Auditoria Coordenada (14/05/2024), e com percentual de andamento total (em 2024) abaixo de 75%

realizadas e das despesas até então efetuadas, bem como para descrever as razões do retardo e as providências adotadas para a conclusão da obra em prazo razoável; 3. Após as manifestações da Defesa e da Auditoria, a assinatura de prazo razoável para a conclusão da creche objeto do convênio realizado com o Governo do Estado, sob pena de imputação de débito, sem prejuízo da aplicação de multa prevista na Lei Orgânica desta Corte.

Até 10 de junho de 2025, apenas três dessas representações tinham sido julgadas. A situação atual é apresentada na Tabela 7, anexada a este relatório.

4 Situação em junho de 2025

A situação das obras conveniadas será objeto de análise no presente item. Passados três anos desde a celebração dos convênios com os municípios, a situação é bastante preocupante, conforme os fatos que serão detalhados nos itens seguintes.

4.1 Disponibilidades dos recursos nas contas municipais

Conforme dados dos balancetes municipais de maio de 2025, as contas específicas dos recursos dos convênios para a construção das creches possuíam um saldo disponível de R\$ 92,46 milhões, o que revela que ainda há um volume considerável de recursos não utilizados. É importante destacar que tais recursos, em geral, ficam aplicados, ou seja, possuem seus valores corrigidos ao longo do tempo conforme o rendimento da aplicação financeira. O detalhamento pode ser encontrado na Tabela 8 deste relatório, em anexo.

4.2 Situação das obras

Visando analisar a situação atual (junho/2025) das obras conveniadas, foram utilizados dados o Sistema Geo-PB do TCE-PB. As obras foram analisadas individualmente, e classificadas da seguinte forma:

- **concluídas** - obras concluídas;
- **atrasadas** - obras que estão em andamento, mas atrasadas em relação ao cronograma;
- **não cadastradas** - obras que não foram iniciadas ou que não possuem dados no sistema;
- **paralisadas** - obras que, em virtude do período sem atualizações, devido à inexistência de evolução ou por informação da própria gestão, estão paralisadas;
- **com dados inconsistentes** - obras informadas, mas que possuem inconsistências nos dados de medições encaminhados.

Foram levadas em consideração as informações do Geo-PB para fins de classificação, independentemente do estado declarado pelo respectivo gestor. Obras informadas como em andamento no Geo-PB podem

ter sido classificadas como paralisadas em decorrência de longo período sem atualizações ou pela baixa evolução entre as medições informadas. A Tabela 1 apresenta as quantidades em cada uma das situações. Foram utilizados também dados das inspeções realizadas durante as auditorias coordenadas mencionadas. Independentemente dos dados enviados ao Geo-PB, aquelas obras já identificadas nas inspeções como concluídas permaneceram com essa situação.

Como podemos observar, 52,11% das obras estão paralisadas, e 14,55% sem informações no Geo-PB, podendo, inclusive, não terem sequer iniciado. Essas duas situações respondem por 2/3 do total dos convênios, fato que revela uma situação grave.

Por sua vez, o gráfico apresentado na Figura 3 ilustra a data final do contrato para execução da obra em relação ao percentual empenhado em relação ao contratado. A linha vermelha demarca a data na qual o levantamento foi realizado (12/jun/2025). É possível observar que várias das obras identificadas como paralisadas não possuem contratos vigentes, enquanto diversas outras possuem prazos que se aproximam do ano de 2027. A lentidão no andamento dessas obras foram detectadas ainda em 2023, ano em que ocorreu a primeira fiscalização coordenada.

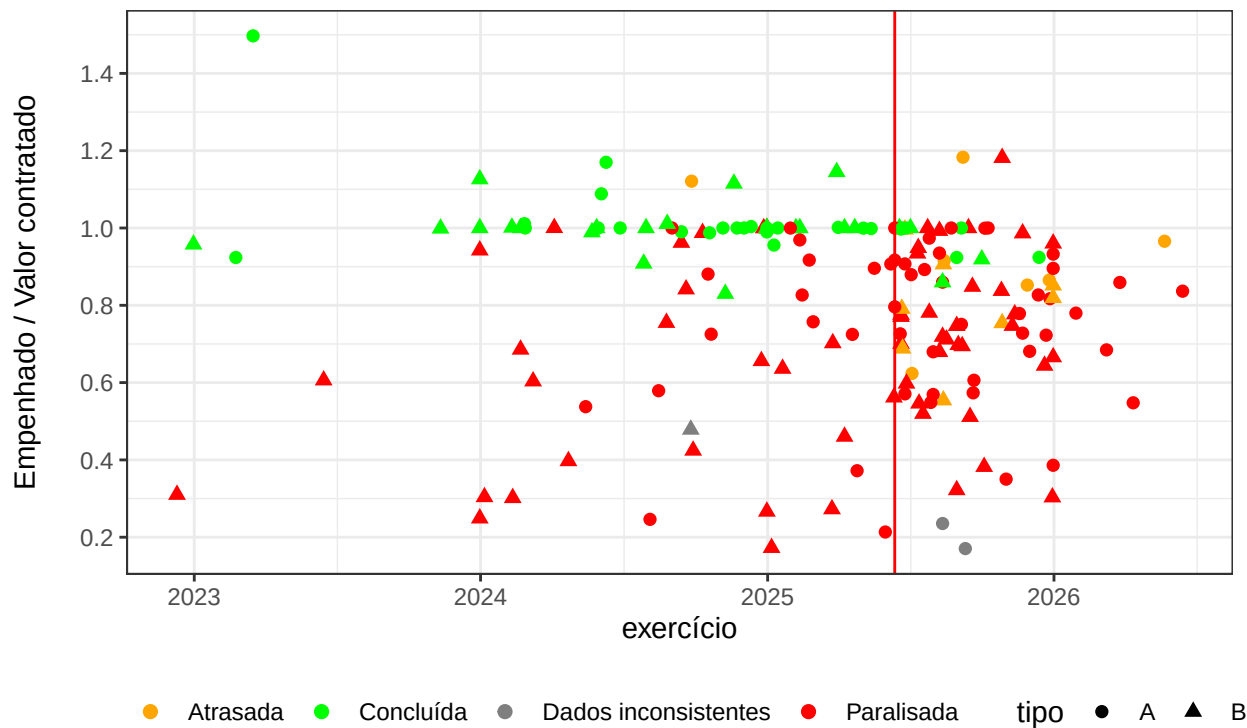


Figura 3: Transferências de recursos dos convênios.

Tabela 1: Situação das obras.

Situação	Freq.	%
Atrasada	16	7,51
Concluída	52	24,41
Dados inconsistentes	3	1,41
Não cadastrada	31	14,55

Tabela 1: Situação das obras. (continuação)

Situação	Freq.	%
Paralisada	111	52,11
Total	213	100,00

^a Fonte: Auditoria - Geo-PB

A situação de algumas obras paralisadas é ilustrada pelas imagens apresentadas a seguir, informadas pela própria gestão no sistema Geo-PB do TCE-PB.



(a) Imaculada



(b) Juazeirinho



(c) São José de Caiana



(d) Monte Horebe



(e) Juarez Távora



(f) Conde

Figura 4: Imagens enviadas ao sistema Geo-PB.

Como podemos observar, várias dessas obras estão em estado de abandono, o que favorece a de-

preciação, furtos de materiais e depredação das estruturas por vândalos. Na Figura 4, os casos de Imaculada, Juazeirinho, São José de Caiana, Monte Horebe, Juarez Távora, Conde.

É importante destacar que várias dessas obras, reportadas como “em andamento” no Geo-PB, na verdade se encontram paralisadas. É o caso da obra de Juarez Távora, que apesar de enviar dados ao Geo-PB há meses de que a obra está em andamento (ver Figura 5), possui a obra paralisada, como demonstrado na Figura 4 (e) acima. Conforme determina o art. 115 da Lei nº 14.133/2021, há responsabilidade da administração em dar transparência a essas ocorrências:

§ 1º É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.




Figura 5: Juarez Távora - dados do Geo-PB.

Na Figura 6 consta imagem de creche concluída no Município de Mogeiro-PB. É possível observar que a Prefeitura Municipal de Mogeiro não só concluiu a obra como fez adaptações no entorno (faixa de pedestres, calçamento, rampa de acesso), visando melhorar o acesso dos usuários.



Figura 6: Creche concluída em Mogeiro-PB.

Das 55 obras classificadas pela Auditoria do TCE-PB com risco alto ou altíssimo, em maio de 2024 (Ver Figura 2), apenas 8 foram concluídas, ou seja, 14,54%.

4.3 Municípios com indícios de inexecução dos recursos recebidos

Após análise dos recursos disponíveis nas contas específicas dos municípios e do confronto com os dados do Geo-PB, detectamos a inexecução em pelo menos nove municípios, relacionados na Tabela 2.

Tabela 2: Obras não iniciadas.

Município	Valor - conta	Valor convênio	Situação da obra
Cabedelo	1.542.703	1.116.745,2	Não cadastrada
João Pessoa	1.541.463	1.116.745,2	Não cadastrada
Curral Velho	1.483.241	1.116.745,2	Não cadastrada
Natuba	1.483.241	1.116.745,2	Não cadastrada
Soledade	1.200.469	869.005,7	Não cadastrada
Guarabira	1.175.574	869.005,7	Não cadastrada
Santa Rita	1.175.398	869.005,7	Não cadastrada
Alagoa Grande	1.173.379	869.005,7	Não cadastrada
São Domingos	1.154.198	869.005,7	Não cadastrada

^a Valor - conta: valores dos saldos nas contas bancárias específicas em maio/2025.

4.4 Prejuízo ao atendimento de crianças

Considerando a situação das obras identificadas como não entregues e a capacidade máxima de cada um dos tipos de creche, ou seja, tipo A para 100 crianças e tipo B para 50 crianças, podemos estimar que **11.850 crianças não estão sendo atendidas** em decorrência da não conclusão desses equipamentos públicos. O cálculo é demonstrado na tabela seguinte.

Tabela 3: Crianças não atendidas.

Situação	Tipo	Freq.	N. crianças por creche	Total crianças
Atrasada	A	8	100	800
Atrasada	B	8	50	400
Dados inconsistentes	A	2	100	200
Dados inconsistentes	B	1	50	50
Não cadastrada	A	13	100	1.300
Não cadastrada	B	18	50	900
Paralisada	A	53	100	5.300
Paralisada	B	58	50	2.900
Total	-	161	-	11.850

No âmbito da Auditoria Coordenada nº 01/2025⁶, cujo objetivo foi inspecionar 103 creches em funci-

⁶Relatório disponível em: <https://tce.pb.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/relatorio_consolidado_final_v1.pdf>

onamento (não necessariamente aquelas resultantes do programa em tela), a Auditoria registrou o que segue:

Das 95 creches/escolas visitadas, 45 (47,37%) possuem mais de 15 anos desde a inauguração. Apenas 12 (12,63%) foram construídas nos últimos 5 anos, como mostra o gráfico da Figura 2. Todas as unidades inspecionadas pertencem à zona urbana dos respectivos municípios, conforme dados do Censo Escolar.

[...]

Em 60% das 95 unidades inspecionadas foi constatada a ocupação superior a 100% da capacidade. Em 88 dessas (92,63%), a ocupação supera 75%, o que demonstra uma evidente demanda superior à oferta de vagas.

Como podemos constatar, há carência de vagas em creches em diversos municípios bem como um baixo percentual de creches novas, ou seja, entregues nos últimos cinco anos.

Conforme dados do Censo Escolar de 2024, havia 59.371 matrículas em creches/escolas públicas municipais paraibanas.

4.5 Comparativo entre as obras visitadas e não visitadas em Auditorias Coordenadas do TCE-PB

Com vistas a comparar o desempenho entre os municípios que tiveram obras fiscalizadas no âmbito das Auditorias Coordenadas e os que não tiveram, elaboramos a Tabela 4. Como podemos observar, no grupo de municípios selecionados (110 creches ao total), foram concluídas 40 obras, ao tempo que, no conjunto de creches não selecionadas (103), foram concluídas apenas 12.

Tabela 4: Comparação entre os municípios visitados e não-visitados.

Situação	Não selecionado	Selecionado
Atrasada	13	3
Concluída	12	40
Dados inconsistentes	3	-
Não cadastrada	23	8
Paralisada	52	59
Total	103	110

Para demonstrarmos de forma mais clara o efeito sobre as fiscalizadas em comparação às não fiscalizadas, vamos calcular a razão de chances das obras que foram iniciadas⁷ serem concluídas.

- Municípios fiscalizados *in loco* pelo TCE-PB nas Auditorias Coordenadas;
 - 102 obras cadastradas;
 - 40 obras concluídas (*c*);

⁷Foram excluídas as obras não cadastradas no Sistema Geo-PB.

- 62 não concluídas (*nc*);
- Calculando as chances de conclusão para os selecionados, temos: $odds_1 = \frac{c}{nc} = \frac{40}{62} \approx 0,65$
- Municípios não fiscalizados *in loco* pelo TCE-PB nas Auditorias Coordenadas;
 - 80 obras cadastradas;
 - 12 obras concluídas (*c*);
 - 68 não concluídas (*nc*);
 - Calculando as chances de conclusão para os não selecionados, temos: $odds_2 = \frac{c}{nc} = \frac{12}{68} \approx 0,18$

Com as chances⁸ dos dois grupos, temos que a Razão de Chances⁹ (OR) é: $OR = \frac{0,65}{0,18} \approx 3,61$.

Em outras palavras, as obras dos municípios fiscalizados no âmbito da Auditoria apresentaram **3,61 vezes mais chances de serem concluídas do que aquelas iniciadas em municípios não selecionados na amostra**. Isso sugere, com razoável evidência, que as ações de fiscalização contribuíram de forma significativa para a entrega dos objetos conveniados.

4.6 Vigências dos convênios - situação em junho de 2025

Em consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado da Paraíba¹⁰, em seção específica para convênios entre o Estado e os municípios, verificamos que apenas 76 convênios estão vigentes no mês de junho de 2025.

Tabela 5: Vigência dos convênios - creches.

Mês/ano	Frequência	Freq. acumulada
dez/2025	1	1
out/2025	1	2
set/2025	44	46
jun/2025	30	76
abr/2025	5	81
mar/2025	47	128
jan/2025	12	140
dez/2024	69	209
mar/2024	2	211
dez/2023	1	212
dez/2022	1	213

^a Dados do Portal da Transparência.

⁸Diferentemente da probabilidade de um evento ocorrer, a chance é a relação entre a frequência com que um evento acontece e a frequência com que ele não acontece. Em outras palavras, uma chance de 0,65 indica que para cada 100 obras não concluídas, 65 foram finalizadas.

⁹A razão de chances é simplesmente uma comparação entre duas chances. Ela nos diz quantas vezes a chance de um evento acontecer é maior (ou menor) em um grupo quando comparado a outro.

¹⁰<<https://transparencia.pb.gov.br/convenios/entre-o-estado-e-os-municipios>>

Tal situação levanta questionamentos sobre quais serão as ações, tanto da Secretaria do Estado da Educação e dos municípios que não finalizaram as obras.

5 Considerações Finais

Em novembro de 2021 o Governo do Estado da Paraíba sancionou a Lei Estadual nº 12.141/2021, dispondo sobre o “Programa Paraíba Primeira Infância”. No mesmo ano, o Governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Educação celebrou convênios com 212 municípios para a construção de 215 creches, para 100 e 50 crianças.

Desde o início de 2022 a Auditoria do TCE-PB realizou diversos trabalhos no acompanhamento da execução dos recursos estaduais repassados, desde a contabilização dos mesmos pelos entes municipais, e realização de procedimentos licitatórios para execução das creches, a movimentação financeiras dos recursos e a fiscalização *in loco*, por mais de uma vez, da execução de 110 obras.

O presente trabalho teve como objetivo fazer a atualização da situação atual da execução desses convênios, através dos dados enviados ao SAGRES e ao Geo-PB, sistema de acompanhamento de obras do TCE-PB. De posse dos dados, seguem os principais achados:

- a) através dos dados coletados anteriormente pela Auditoria bem como através dos dados disponíveis no GeoPB, foi possível identificar 111 obras paralisadas (52,11%) do total;
- b) após três anos da celebração dos convênios com os municípios, o número de creches identificadas como concluídas é de apenas 52 (24,41%) do total;
- c) apesar de algumas obras constarem com situação “em andamento” no Geo-PB, a situação fática é de paralisia, sem atualizações há meses ou com inconsistências nos dados;
- d) foram identificados nove municípios sem a execução dos recursos conveniados;
- e) considerando as obras identificadas como não entregues e considerando a capacidade máxima de cada uma dessas, foi estimado um prejuízo no atendimento de 11.850 crianças;
- f) conforme dados do SAGRES/TCE-PB, foi constatado um saldo de R\$ 92,46 milhões em contas municipais decorrente dos recursos repassados pelo Governo do Estado, ou seja, recursos não aplicados;
- g) as obras inspecionadas em auditorias do TCE-PB apresentaram 3,61 vezes mais chances de serem concluídas do que aquelas que não foram;
- h) conforme dados do Portal da Transparência do Governo do Estado, apenas 76 convênios estão vigentes atualmente (jun/2025).

Diante das constatações supramencionadas, podemos concluir que, apesar das diversas ações do TCE-PB com vistas a fiscalizar e impulsionar a entrega dos objetos conveniados, o volume de obras entregues ainda é muito inferior ao esperado, cabendo a ambos os lados, municípios e Governo do Estado, a adoção de medidas mais eficazes, visando solucionar as obras paralisadas ou com lentidão.

Destacamos ainda o transcurso de três anos desde a celebração desses convênios, cujas obras deveriam ser concluídas em menos de um ano. Tal fato demonstra grave ineficiência da maioria dos municípios

na execução das obras, assim como o prejuízo irreparável à sociedade, uma vez que milhares de crianças não estão sendo atendidas em creches públicas.

6 Anexos

Tabela 6: Situação das obras em junho de 2025.

Município	Link para o Geo-PB	Situação
Água Branca	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1195	Paralisada
Aguiar	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1594	Paralisada
Alagoa Grande	-	Não cadastrada
Alagoa Nova	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/258	Concluída
Alagoinha	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/5579	Paralisada
Alcantil	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2449	Paralisada
Algodão de Jandaíra	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1130	Atrasada
Alhandra	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/966	Concluída
Amparo	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1543	Atrasada
Aparecida	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2077	Concluída
Arara	-	Não cadastrada
Araruna	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1916	Concluída
Araçagi	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/505	Paralisada
Areia	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/877	Paralisada
Areia de Baraúnas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4391	Paralisada
Areial	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/561	Paralisada
Aroeiras	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1985	Paralisada
Assunção	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/279	Paralisada
Bananeiras	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/5503	Paralisada
Barra de Santa Rosa	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2249	Concluída
Barra de Santana	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3138	Paralisada
Barra de São Miguel	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4927	Paralisada
Bayeux	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4309	Dados inconsistentes
Baía da Traição	-	Não cadastrada
Bernardino Batista	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1933	Concluída
Boa Ventura	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3285	Paralisada
Boa Vista	-	Não cadastrada
Bom Jesus	-	Concluída
Bom Sucesso	-	Não cadastrada
Bonito de Santa Fé	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2079	Concluída
Boqueirão	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/940	Paralisada
Borborema	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1966	Paralisada
Brejo do Cruz	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3170	Paralisada
Brejo dos Santos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1014	Paralisada
Caaporã	-	Não cadastrada
Cabaceiras	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2312	Concluída
Cabaceiras	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1293	Concluída
Cabedelo	-	Não cadastrada
Cachoeira dos Índios	-	Não cadastrada
Cacimba de Areia	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1257	Paralisada
Cacimba de Dentro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/720	Atrasada
Cacimbas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2283	Paralisada
Caiçara	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3037	Paralisada

Tabela 6: Situação das obras em junho de 2025. (continuação)

Município	Link para o Geo-PB	Situação
Cajazeiras	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3319	Paralisada
Cajazeirinhas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3175	Paralisada
Caldas Brandão	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2321	Paralisada
Camalaú	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/527	Paralisada
Camalaú	-	Não cadastrada
Capim	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2363	Concluída
Caraúbas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1691	Paralisada
Carrapateira	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1755	Concluída
Casserengue	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2011	Atrasada
Catingueira	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/993	Paralisada
Catolé do Rocha	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1766	Paralisada
Caturité	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1926	Concluída
Conceição	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/962	Paralisada
Condado	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/372	Paralisada
Conde	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/909	Paralisada
Congo	-	Não cadastrada
Coremas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2992	Paralisada
Coxixola	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3085	Atrasada
Cruz do Espírito Santo	-	Não cadastrada
Cubati	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/798	Concluída
Cuité	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/572	Concluída
Cuité de Mamanguape	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2959	Paralisada
Curral Velho	-	Não cadastrada
Curral de Cima	-	Não cadastrada
Damião	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1413	Concluída
Desterro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2250	Concluída
Diamante	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1708	Paralisada
Dona Inês	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1981	Concluída
Duas Estradas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1578	Paralisada
Emas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1906	Concluída
Esperança	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/445	Paralisada
Fagundes	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3140	Atrasada
Frei Martinho	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2086	Concluída
Gado Bravo	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2262	Concluída
Guarabira	-	Não cadastrada
Gurinhém	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1477	Paralisada
Gurjão	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1208	Paralisada
Ibiara	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/967	Paralisada
Igaracy	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1990	Atrasada
Imaculada	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/963	Paralisada
Ingá	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1515	Paralisada
Itabaiana	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1163	Atrasada
Itaporanga	-	Não cadastrada
Itapororoca	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/549	Paralisada
Itatuba	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3595	Atrasada

Tabela 6: Situação das obras em junho de 2025. (continuação)

Município	Link para o Geo-PB	Situação
Jacaraú	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/5172	Paralisada
Jericó	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2284	Atrasada
Joca Claudino	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/82	Atrasada
João Pessoa	-	Não cadastrada
Juarez Távora	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2270	Paralisada
Juazeirinho	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2182	Paralisada
Junco do Seridó	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1481	Paralisada
Juripiranga	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1223	Concluída
Juru	-	Não cadastrada
Lagoa	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1400	Paralisada
Lagoa de Dentro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1741	Concluída
Lastro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1713	Paralisada
Livramento	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/84	Paralisada
Logradouro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/211	Paralisada
Lucena	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1615	Paralisada
Malta	-	Não cadastrada
Mamanguape	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/842	Paralisada
Manaíra	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/930	Paralisada
Marcação	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1760	Paralisada
Mari	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/806	Paralisada
Marizópolis	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/375	Paralisada
Massaranduba	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1410	Paralisada
Mataraca	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/843	Concluída
Matinhas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/5007	Paralisada
Mato Grosso	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/391	Paralisada
Maturéia	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1951	Paralisada
Mogeiro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1592	Concluída
Montadas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2337	Concluída
Monte Horebe	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1625	Paralisada
Monteiro	-	Não cadastrada
Mulungu	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2157	Paralisada
Mãe d'Água	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4457	Paralisada
Natuba	-	Não cadastrada
Nazarezinho	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/612	Paralisada
Nova Olinda	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/154	Paralisada
Nova Palmeira	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1331	Paralisada
Olho d'Água	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1227	Paralisada
Olivedos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1267	Paralisada
Ouro Velho	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1250	Concluída
Parari	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1549	Concluída
Passagem	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1712	Concluída
Patos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2004	Concluída
Patos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2241	Concluída
Paulista	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2288	Concluída
Pedra Branca	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1770	Concluída

Tabela 6: Situação das obras em junho de 2025. (continuação)

Município	Link para o Geo-PB	Situação
Pedra Lavrada	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2014	Concluída
Pedras de Fogo	-	Não cadastrada
Pedro Régis	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4426	Dados inconsistentes
Piancó	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/758	Paralisada
Picuí	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3397	Paralisada
Pilar	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/761	Paralisada
Pilões	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1048	Concluída
Pilõezinhos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4845	Paralisada
Pirpirituba	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/64	Paralisada
Pitimbu	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/863	Paralisada
Pocinhos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1893	Atrasada
Pombal	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/96	Paralisada
Poço Dantas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/3386	Atrasada
Poço de José de Moura	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/556	Paralisada
Prata	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1518	Concluída
Princesa Isabel	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2100	Concluída
Puxinanã	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1346	Paralisada
Queimadas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1142	Paralisada
Remígio	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1050	Paralisada
Riacho de Santo Antônio	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1776	Paralisada
Riacho dos Cavalos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/104	Dados inconsistentes
Riachão	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/310	Paralisada
Riachão do Bacamarte	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1780	Concluída
Riachão do Poço	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/951	Paralisada
Rio Tinto	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1690	Paralisada
Salgadinho	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2022	Concluída
Salgado de São Félix	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2178	Atrasada
Santa Cecília	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1366	Paralisada
Santa Cruz	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4594	Paralisada
Santa Helena	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/991	Concluída
Santa Inês	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1622	Paralisada
Santa Luzia	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1561	Concluída
Santa Rita	-	Não cadastrada
Santana de Mangueira	-	Não cadastrada
Santana dos Garrotes	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2286	Paralisada
Santo André	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/739	Paralisada
Sapé	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1397	Paralisada
Serra Branca	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/782	Paralisada
Serra Grande	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1323	Paralisada
Serra Redonda	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4241	Atrasada
Serra da Raiz	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1816	Concluída
Serraria	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/455	Paralisada
Sertãozinho	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1062	Paralisada
Sobrado	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/934	Paralisada
Soledade	-	Não cadastrada

Tabela 6: Situação das obras em junho de 2025. (continuação)

Município	Link para o Geo-PB	Situação
Solânea	-	Não cadastrada
Sossêgo	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/355	Paralisada
Sousa	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1444	Paralisada
Sumé	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1542	Concluída
São Bentinho	-	Não cadastrada
São Bento	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1169	Concluída
São Domingos	-	Não cadastrada
São Domingos do Cariri	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2123	Concluída
São Francisco	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1033	Paralisada
São José da Lagoa Tapada	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2683	Concluída
São José de Caiana	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/876	Paralisada
São José de Espinharas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/914	Paralisada
São José de Piranhas	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1918	Concluída
São José de Princesa	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1619	Paralisada
São José do Bonfim	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/136	Paralisada
São José do Brejo do Cruz	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1419	Paralisada
São José dos Ramos	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1624	Concluída
São João do Cariri	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/588	Paralisada
São João do Rio do Peixe	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2428	Concluída
São João do Tigre	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/4953	Paralisada
São Mamede	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1565	Paralisada
São Miguel de Taipu	-	Não cadastrada
São Sebastião de Lagoa de Roça	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1292	Concluída
São Vicente do Seridó	-	Não cadastrada
Tacima	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2059	Concluída
Taperoá	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1125	Atrasada
Tavares	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1964	Paralisada
Teixeira	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1784	Paralisada
Tenório	-	Não cadastrada
Triunfo	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/2570	Paralisada
Uiraúna	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/33	Concluída
Umbuzeiro	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/801	Paralisada
Vieirópolis	-	Não cadastrada
Vista Serrana	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/1536	Paralisada
Zabelê	https://geopb.tce.pb.gov.br/consulta/detalhes/5712	Paralisada

Tabela 7: Representações - MPC.

Jurisdicionado	Protocolo	Estágio
Prefeitura Municipal de Aroeiras	00758/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Boqueirão	00770/24	Com Parecer do MPJTCE
Prefeitura Municipal de Cabaceiras	00798/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Catingueira	00757/24	Prazo para Defesa
Prefeitura Municipal de Conde	00799/24	Com Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Curral de Cima	00786/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Gurjão	00800/24	Finalizado
Prefeitura Municipal de Igaracy	00771/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Ingá	00802/24	Prazo para Defesa
Prefeitura Municipal de Juarez Távora	00787/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	00772/24	Com Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Manaira	00773/24	Planejado - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Marcação	00775/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Olho d'Água	00788/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Pombal	00803/24	Prazo para Defesa
Prefeitura Municipal de Remígio	00804/24	Juntado
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio	00805/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Rio Tinto	00789/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Santa Cecília	00790/24	Decisão Publicada
Prefeitura Municipal de Serra Branca	00776/24	Estoque - Relatório de Recurso
Prefeitura Municipal de São José de Princesa	00791/24	Estoque - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	00793/24	Aguardando Inserção de Decisão
Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó	00759/24	Planejado - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Taperoá	00777/24	Planejado - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Teixeira	00778/24	Planejado - Relatório de Defesa
Prefeitura Municipal de Tenório	00794/24	Planejado - Relatório de Defesa

^a Situação em 10 de junho de 2025, conforme análise da Auditoria do TCE-PB.

Tabela 8: Disponibilidades nas contas vinculadas - maio/2025

Município	Total recebido - convênio	Disponível	N. de convênios
Água Branca	869.005,7	433.505,52	1
Aguiar	1.116.745,2	129.659,17	1
Alagoa Grande	869.005,7	1.173.379,20	1
Alagoa Nova	1.116.745,2	223.413,04	1
Alagoinha	1.116.745,2	1.297.321,83	1
Alcantil	869.005,7	370.388,96	1
Algodão de Jandaíra	869.005,7	364.611,40	1
Alhandra	1.116.745,2	352.525,97	1
São João do Rio do Peixe	869.005,7	12.865,24	1
Amparo	1.116.745,2	89.789,49	1
Aparecida	869.005,7	4.991,41	1
Araçagi	869.005,7	36.832,59	1
Arara	869.005,7	281.104,14	1
Araruna	869.005,7	205.216,11	1
Areia	869.005,7	613.617,66	1
Areia de Baraúnas	869.005,7	449.873,22	1
Areial	869.005,7	587.983,50	1
Aroeiras	1.116.745,2	597.043,90	1
Assunção	869.005,7	154.034,24	1
Baía da Traição	869.005,7	476.139,43	1
Bananeiras	869.005,7	901.854,17	1
Barra de Santana	869.005,7	907.350,73	1
Barra de Santa Rosa	869.005,7	62,07	1
Barra de São Miguel	869.005,7	737.935,96	1
Bayeux	1.116.745,2	1.476.491,02	1
Bernardino Batista	869.005,7	144.694,96	1
Boa Ventura	1.116.745,2	649.242,58	1
Boa Vista	1.116.745,2	569.339,18	1
Bom Jesus	1.116.745,2	2.377,06	1
Bom Sucesso	869.005,7	358.048,53	1
Bonito de Santa Fé	1.116.745,2	196.759,91	1
Boqueirão	869.005,7	366.264,56	1
Igaracy	1.116.745,2	153.996,55	1
Borborema	1.116.745,2	505.242,07	1
Brejo do Cruz	869.005,7	689.642,95	1
Brejo dos Santos	1.116.745,2	569.223,84	1
Caaporã	869.005,7	869.456,50	1
Cabaceiras	1.985.750,9	229.008,50	2
Cabedelo	1.116.745,2	1.542.703,04	1
Cachoeira dos Índios	1.116.745,2	756.118,89	1
Cacimba de Areia	1.116.745,2	0,00	1
Cacimba de Dentro	869.005,7	384.513,48	1
Cacimbas	1.116.745,2	174.107,41	1
Caiçara	1.116.745,2	622.965,29	1
Cajazeiras	869.005,7	583.271,66	1

Tabela 8: Disponibilidades nas contas vinculadas - maio/2025 (continuação)

Município	Total recebido - convênio	Disponível	N. de convênios
Cajazeirinhas	1.116.745,2	620.032,88	1
Caldas Brandão	1.116.745,2	374.049,77	1
Camalaú	2.233.490,4	1.248.016,35	2
Capim	869.005,7	97.283,35	1
Caraúbas	1.116.745,2	192.093,12	1
Carrapateira	869.005,7	111.049,52	1
Casserengue	869.005,7	145.681,35	1
Catingueira	1.116.745,2	432.501,38	1
Catolé do Rocha	869.005,7	472.516,80	1
Caturité	869.005,7	68.864,51	1
Conceição	1.116.745,2	675.855,34	1
Condado	869.005,7	313.832,42	1
Conde	869.005,7	528.384,94	1
Congo	1.116.745,2	814.815,21	1
Coremas	869.005,7	642.479,43	1
Coxixola	1.116.745,2	571.691,02	1
Cruz do Espírito Santo	1.116.745,2	675.571,10	1
Cubati	869.005,7	172.339,58	1
Cuité	869.005,7	204.950,13	1
Cuité de Mamanguape	869.005,7	689.895,97	1
Curral de Cima	869.005,7	439.519,78	1
Curral Velho	1.116.745,2	1.483.241,21	1
Damião	1.116.745,2	245.429,52	1
Desterro	1.116.745,2	1.457,59	1
Vista Serrana	1.116.745,2	238.084,31	1
Diamante	869.005,7	409.181,13	1
Dona Inês	1.116.745,2	189.930,35	1
Duas Estradas	1.116.745,2	534.809,27	1
Emas	1.116.745,2	25.259,30	1
Esperança	1.116.745,2	768.861,21	1
Fagundes	1.116.745,2	773.012,70	1
Frei Martinho	1.116.745,2	186.929,51	1
Gado Bravo	1.116.745,2	201.487,41	1
Guarabira	869.005,7	1.175.574,22	1
Gurinhém	1.116.745,2	594.417,82	1
Gurjão	1.116.745,2	236.524,87	1
Ibiara	869.005,7	482.626,60	1
Imaculada	869.005,7	385.522,14	1
Ingá	1.116.745,2	145.438,11	1
Itabaiana	869.005,7	173.757,72	1
Itaporanga	1.116.745,2	626.638,01	1
Itapororoca	869.005,7	722.252,24	1
Itatuba	1.116.745,2	680.379,69	1
Jacaraú	1.116.745,2	1.135.993,17	1
Jericó	869.005,7	261,06	1

Tabela 8: Disponibilidades nas contas vinculadas - maio/2025 (continuação)

Município	Total recebido - convênio	Disponível	N. de convênios
João Pessoa	1.116.745,2	1.541.462,76	1
Juarez Távora	869.005,7	26.790,39	1
Juazeirinho	1.116.745,2	595.570,64	1
Junco do Seridó	1.116.745,2	344.672,46	1
Juripiranga	1.116.745,2	243.587,85	1
Juru	869.005,7	306.874,13	1
Lagoa	869.005,7	142.690,66	1
Lagoa de Dentro	1.116.745,2	188.606,44	1
Lastro	1.116.745,2	362.000,27	1
Livramento	1.116.745,2	757.042,77	1
Logradouro	869.005,7	531.608,83	1
Lucena	869.005,7	274.693,57	1
Mãe d'Água	1.116.745,2	794.572,10	1
Malta	869.005,7	10,45	1
Mamanguape	1.116.745,2	348.948,30	1
Manaíra	869.005,7	248.053,29	1
Marcação	869.005,7	368.313,45	1
Mari	1.116.745,2	266.908,15	1
Marizópolis	1.116.745,2	766.574,02	1
Massaranduba	869.005,7	523.980,16	1
Mataraca	1.116.745,2	63.472,31	1
Matinhas	869.005,7	563.623,84	1
Mato Grosso	1.116.745,2	698.835,77	1
Maturéia	869.005,7	96.320,50	1
Mogeiro	1.116.745,2	266.560,43	1
Montadas	869.005,7	108.295,15	1
Monte Horebe	869.005,7	457.090,93	1
Monteiro	1.116.745,2	621.143,89	1
Mulungu	869.005,7	764.862,92	1
Natuba	1.116.745,2	1.483.241,21	1
Nazarezinho	869.005,7	469.838,36	1
Nova Olinda	869.005,7	965.507,73	1
Nova Palmeira	869.005,7	424.053,97	1
Olho d'Água	1.116.745,2	252.715,30	1
Olivedos	1.116.745,2	304.609,39	1
Ouro Velho	1.116.745,2	344.695,47	1
Parari	869.005,7	11.591,73	1
Passagem	869.005,7	100.882,83	1
Patos	1.985.750,9	216.538,98	2
Paulista	1.116.745,2	121.015,15	1
Pedra Branca	869.005,7	129.592,51	1
Pedra Lavrada	1.116.745,2	129.062,89	1
Pedras de Fogo	869.005,7	593.200,03	1
Piancó	1.116.745,2	418.275,33	1
Picuí	869.005,7	876.686,25	1

Tabela 8: Disponibilidades nas contas vinculadas - maio/2025 (continuação)

Município	Total recebido - convênio	Disponível	N. de convênios
Pilar	1.116.745,2	563.942,57	1
Pilões	869.005,7	155.407,60	1
Pilõezinhos	869.005,7	727.689,75	1
Pirpirituba	869.005,7	504.596,56	1
Pitimbu	1.116.745,2	360.203,43	1
Pocinhos	1.116.745,2	237.072,62	1
Poço Dantas	1.116.745,2	341.668,15	1
Poço de José de Moura	869.005,7	858.408,22	1
Pombal	869.005,7	395.706,66	1
Prata	1.116.745,2	0,00	1
Princesa Isabel	869.005,7	4.733,05	1
Puxinanã	869.005,7	841.563,81	1
Queimadas	869.005,7	696.662,33	1
Remígio	1.116.745,2	848.924,27	1
Pedro Régis	1.116.745,2	1.229.204,37	1
Riachão	1.116.745,2	681.575,34	1
Riachão do Bacamarte	1.116.745,2	177.134,76	1
Riachão do Poço	1.116.745,2	563.992,59	1
Riacho de Santo Antônio	1.116.745,2	202.302,95	1
Riacho dos Cavalos	869.005,7	852.700,08	1
Rio Tinto	869.005,7	854.106,62	1
Salgadinho	1.116.745,2	144.816,24	1
Salgado de São Félix	1.116.745,2	144.308,53	1
Santa Cecília	1.116.745,2	331.785,70	1
Santa Cruz	869.005,7	660.719,22	1
Santa Helena	869.005,7	202.323,84	1
Santa Inês	869.005,7	263.118,09	1
Santa Luzia	1.116.745,2	120.545,18	1
Santana de Mangueira	1.116.745,2	97.386,63	1
Santana dos Garrotes	1.116.745,2	557.091,02	1
Joca Claudino	869.005,7	632.138,95	1
Santa Rita	869.005,7	1.175.398,41	1
Santo André	869.005,7	96.501,85	1
São Bento	1.116.745,2	282.493,53	1
São Bentinho	1.116.745,2	0,00	1
São Domingos do Cariri	869.005,7	101.410,70	1
São Domingos	869.005,7	1.154.197,93	1
São Francisco	1.116.745,2	302.183,53	1
São João do Cariri	1.116.745,2	382.971,96	1
São João do Tigre	1.116.745,2	221.457,91	1
São José da Lagoa Tapada	869.005,7	904.828,52	1
São José de Caiana	1.116.745,2	600.388,41	1
São José de Espinharas	869.005,7	205.543,59	1
São José dos Ramos	1.116.745,2	222.127,57	1
São José de Piranhas	869.005,7	175.915,54	1

Tabela 8: Disponibilidades nas contas vinculadas - maio/2025 (continuação)

Município	Total recebido - convênio	Disponível	N. de convênios
São José de Princesa	869.005,7	480.149,03	1
São José do Bonfim	1.116.745,2	421.859,66	1
São José do Brejo do Cruz	869.005,7	0,00	1
São Mamede	869.005,7	166.976,33	1
São Miguel de Taipu	869.005,7	462.460,67	1
São Sebastião de Lagoa de Roça	1.116.745,2	243.471,28	1
Sapé	1.116.745,2	445.739,77	1
São Vicente do Seridó	1.116.745,2	617.040,62	1
Serra Branca	869.005,7	544.429,10	1
Serra da Raiz	1.116.745,2	177.295,17	1
Serra Grande	1.116.745,2	269.540,08	1
Serra Redonda	869.005,7	321.976,40	1
Serraria	1.116.745,2	814.759,27	1
Sertãozinho	1.116.745,2	412.180,86	1
Sobrado	869.005,7	273.523,79	1
Solânea	869.005,7	156.939,06	1
Soledade	869.005,7	1.200.468,71	1
Sossêgo	869.005,7	518.797,34	1
Sousa	869.005,7	197.028,26	1
Sumé	1.116.745,2	1.934,49	1
Tacima	869.005,7	126.263,25	1
Taperoá	869.005,7	415.094,21	1
Tavares	1.116.745,2	159.723,31	1
Teixeira	869.005,7	230.358,26	1
Tenório	869.005,7	579.948,67	1
Triunfo	869.005,7	8.733,74	1
Uiraúna	869.005,7	232.281,85	1
Umbuzeiro	869.005,7	456.336,36	1
Vieirópolis	869.005,7	140.402,38	1
Zabelê	1.116.745,2	1.039.510,91	1
Total	211.110.860,5	92.460.605,01	213

^a Conforme dados do balancete de maio de 2025.
