



**Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI**

**Auditoria Coordenada na Educação Infantil**

**Primeiros Resultados**

**15 de maio de 2024**



# Programa Paraíba Primeira Infância

**Objetivo declarado do Programa:** Garantir o acesso das crianças dos municípios às políticas públicas, visando, principalmente, o desenvolvimento em todos os aspectos biopsicossociais.

**Objeto dos Convênios:** Construção de Creches para **100** crianças (Cat. A: R\$ 1,1 milhão) e **50** crianças (Cat. B: 0,9 milhão);

**215 convênios** (106 A e 109 B) entre o Governo do Estado e **212 municípios**<sup>(1)</sup>.

**Recursos repassados** entre dezembro de 2021 e junho de 2022: **R\$ 213 milhões**.

**Atendimento à 16.050 crianças.**

Pagamentos efetuados nas contas específicas dos convênio (R\$ milhões)	112
Municípios em que não foram identificadas licitações ou movimentação das contas específicas	13
Municípios que devolveram os recursos do convênio <sup>(2)</sup>	2


<sup>(1)</sup> 2 creches: Patos, Cabaceiras e Camalaú

<sup>(2)</sup> Nova Palmeira e Belém do Brejo do Cruz



Últimos dados recebidos às 16:44h

Todos os municípios

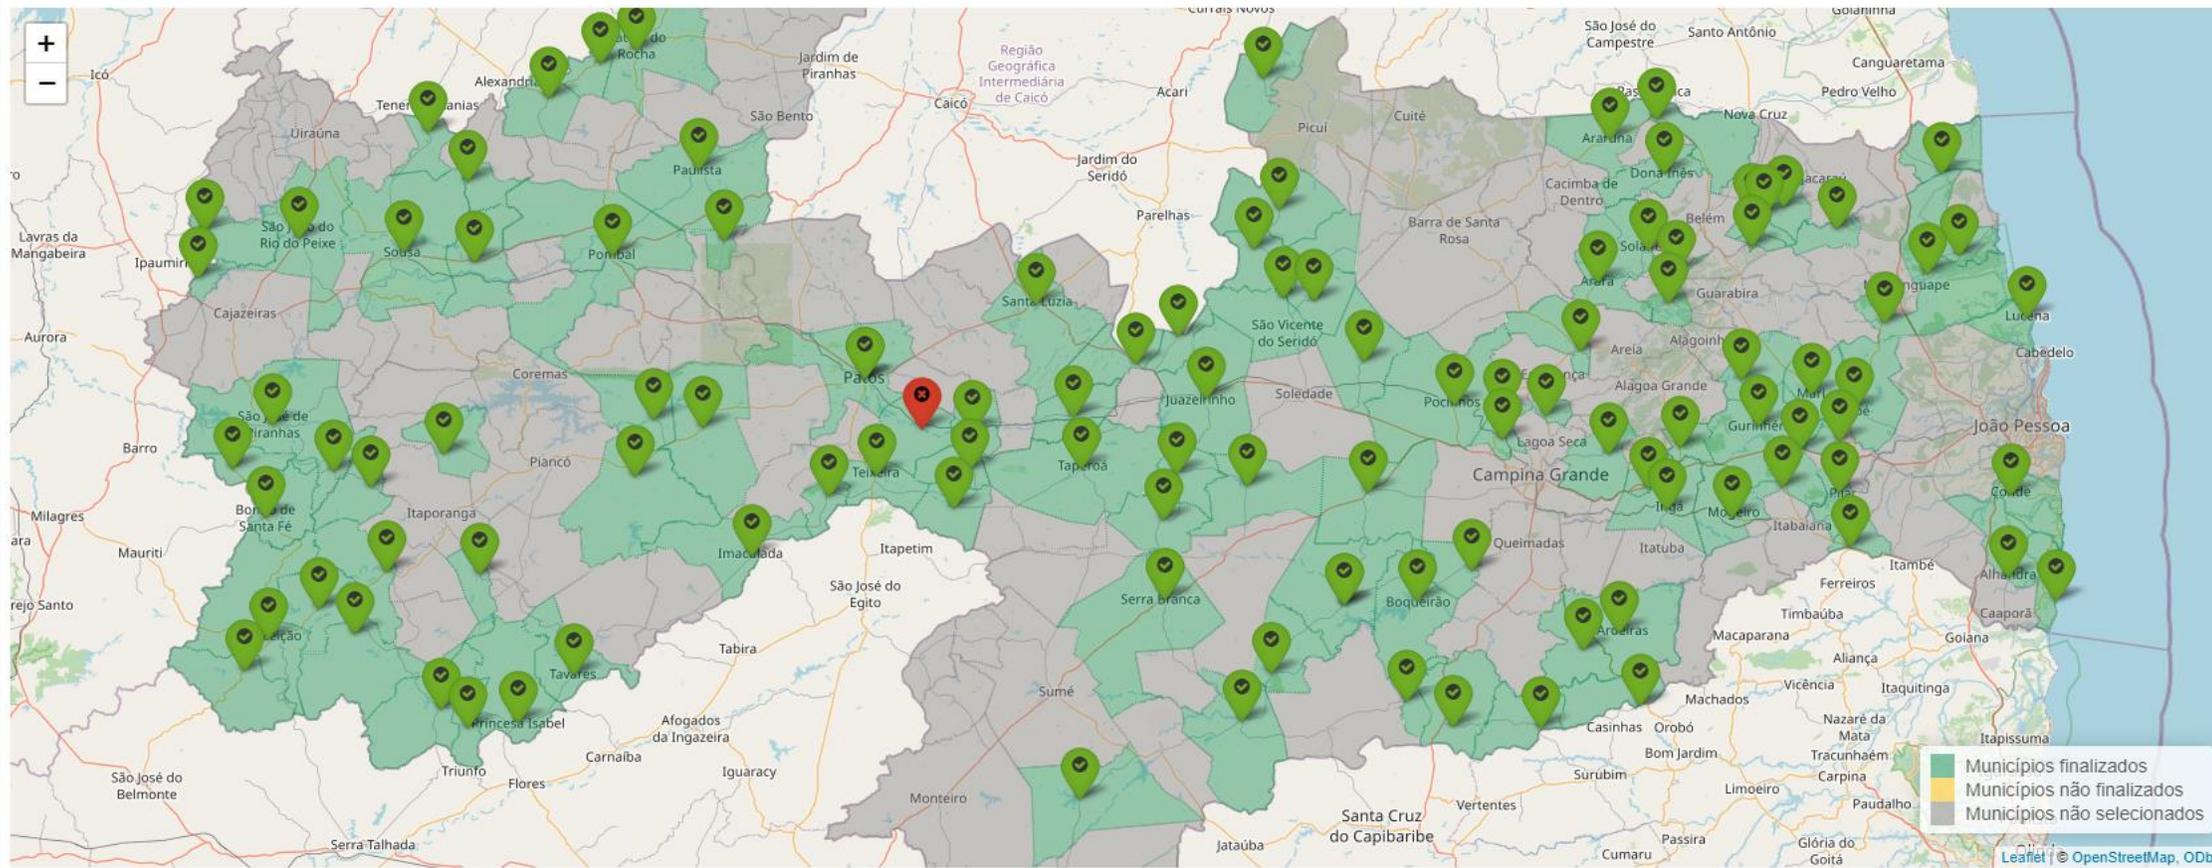

**108/108**  
100,00% dos municípios concluídos

**110/110**  
100,00% das obras inspecionadas

**68**  
ACE/TCP em campo

**64**  
Obras geolocalizadas

**905**  
Registros fotográficos




# Auditoria Coordenada

- ✓ **110 Creches em 108 municípios**
- ✓ Recursos envolvidos: **R\$ 124 milhões**
- ✓ Atendimento à **8.500 crianças**
  
- ✓ **1ª fiscalização: 15/08/2023**
- ✓ **2ª fiscalização: 14/05/2024 (9 meses)**



### Situação durante a inspeção

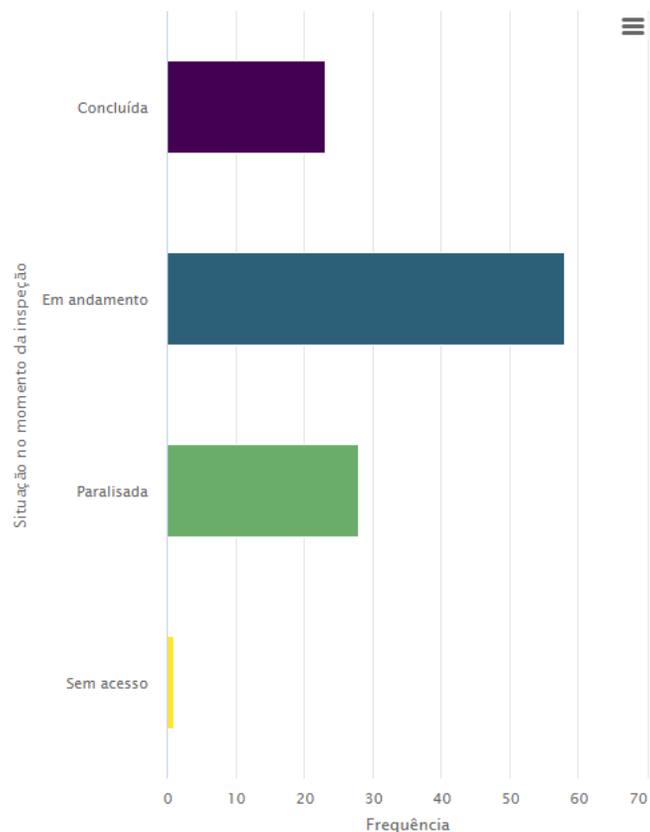

\*Dados coletados em inspeção.

Situação da Obra	2023	2024	%
Concluída	3	23	20,9%
Em andamento	82	58	52,7%
Paralisada	24	28	25,5%
Sem acesso	1	1 <sup>(1)</sup>	0,9%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100,0%</b>

23 concluídas  
12 em funcionamento<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Cacimba de Areia

<sup>(2)</sup> Aparecida, Bom Jesus, Bonito de Santa Fé, Capim, Desterro, Passagem, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Salgadinho, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas



# Em funcionamento



Aparecida:  
R\$ 844.774,77




Bom Jesus:  
R\$ 1.383.965,59



# Em funcionamento




Bonito de Santa Fé:  
R\$ 860.157,89

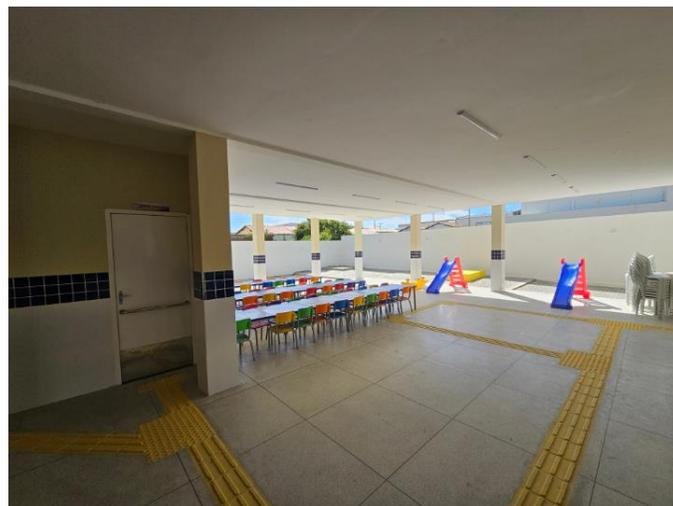


Paulista:  
R\$ 1.340.825,19



# Em funcionamento

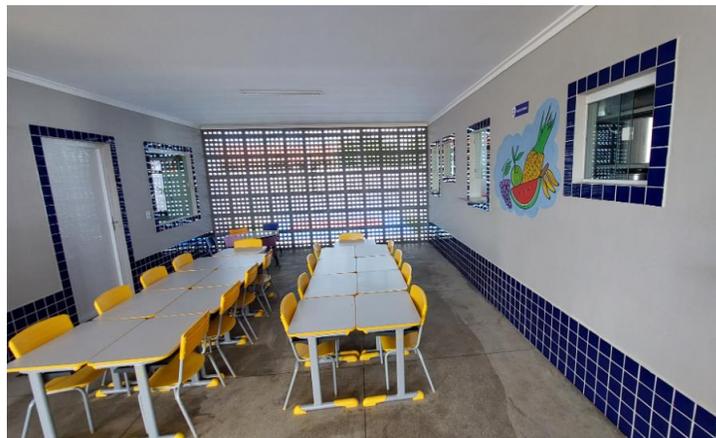

São João do Rio do Peixe:  
R\$ 966.294,89

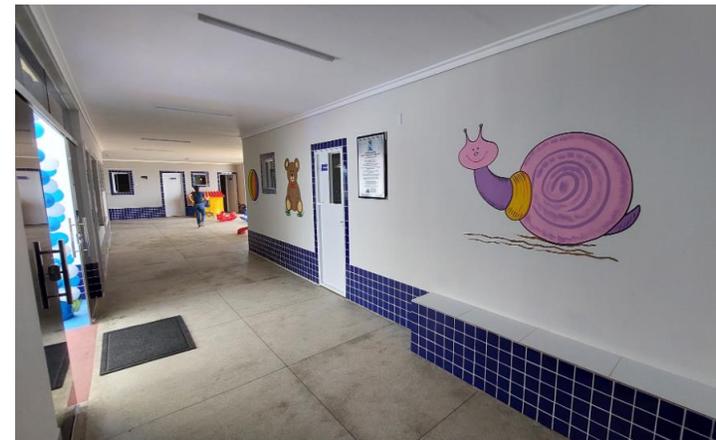



# Outros Registros Fotográficos



Borborema



Araruna



Curral de Cima



Taperoá



Borborema



# Evolução das Obras

## ➤ 82 em andamento em 2023


- 20 concluídas
- 43 em andamento
- 18 paralisadas
- 1 sem acesso

## ➤ 24 paralisadas em 2023

- 14 em andamento
- 10 paralisada



# Evolução das Obras

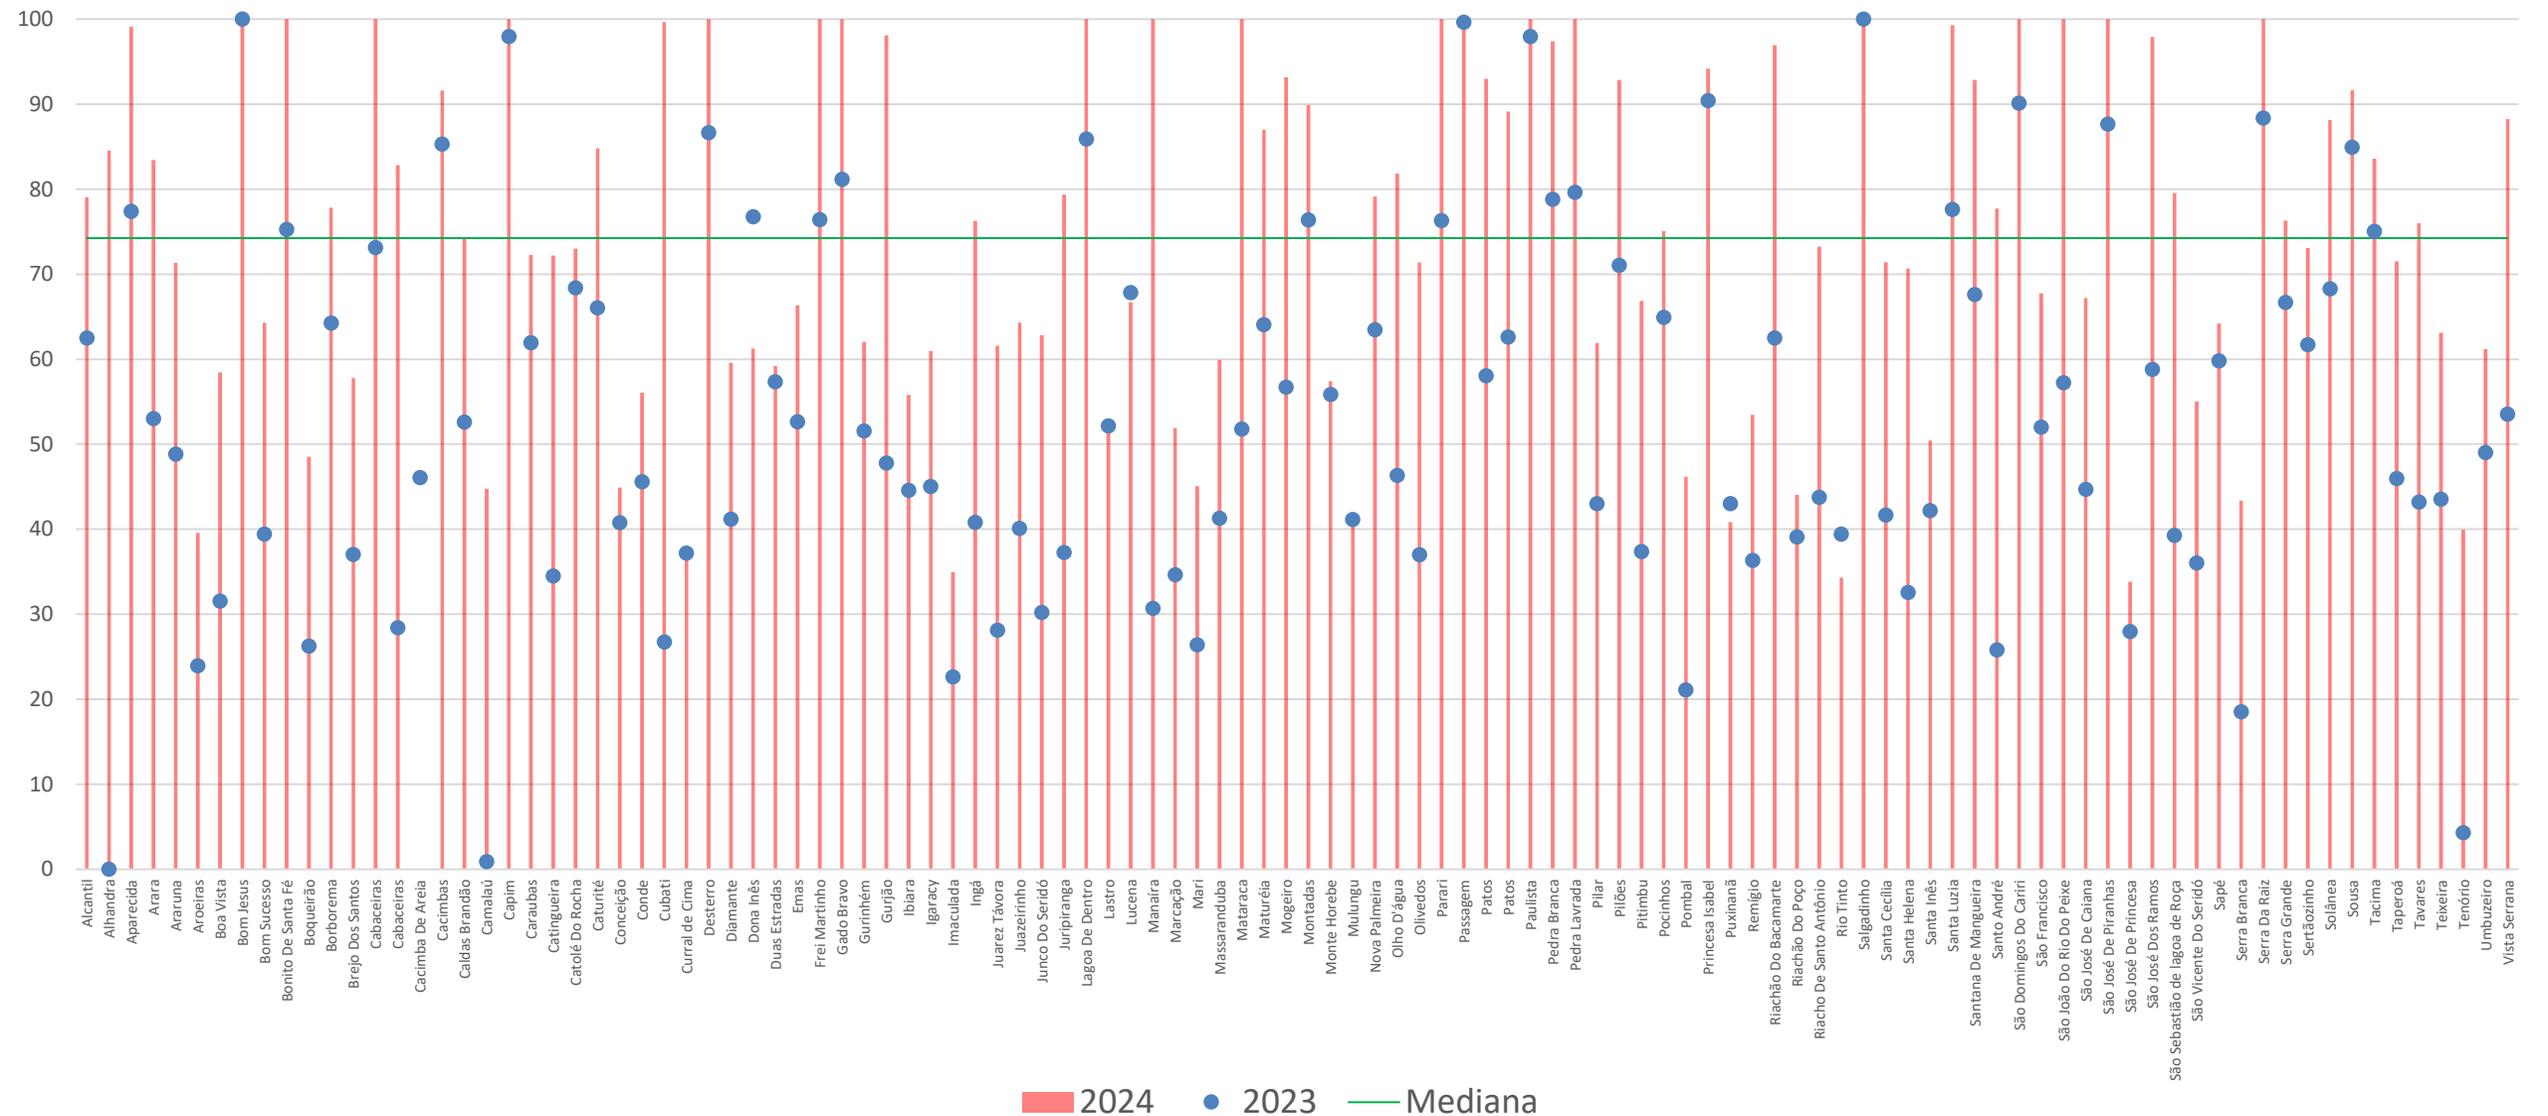




# Evolução das Obras

## ➤ 58 em andamento em 2024

- 19 com variação < 15% em relação a 2023
- 24 acima de 75%
- 6 abaixo de 50%

## ➤ 28 paralisadas em 2024

- 12 com variação < 15% em relação a 2023
- 7 acima de 75%
- 9 abaixo de 50%

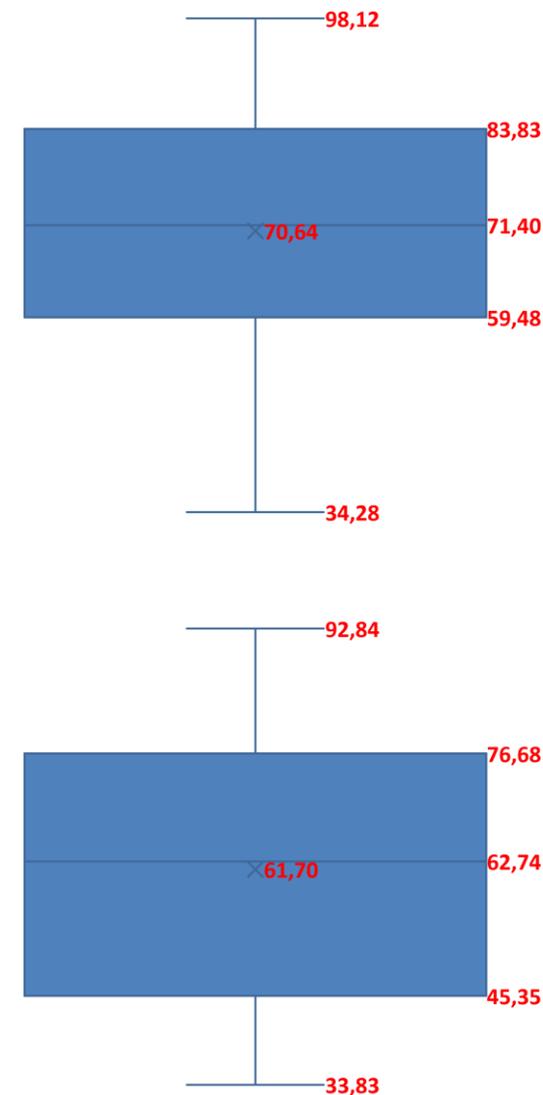



# Próximas Ações

- Emissão de relatório consolidado
- Emissão de relatórios individualizados de acompanhamento
- Sugestão de emissão de Alertas
- Subsidiar Processo nº 07333/23
